




Inbetriebnahmeprotokoll Wohnraumlüftung

Leaf 1 LOXONE

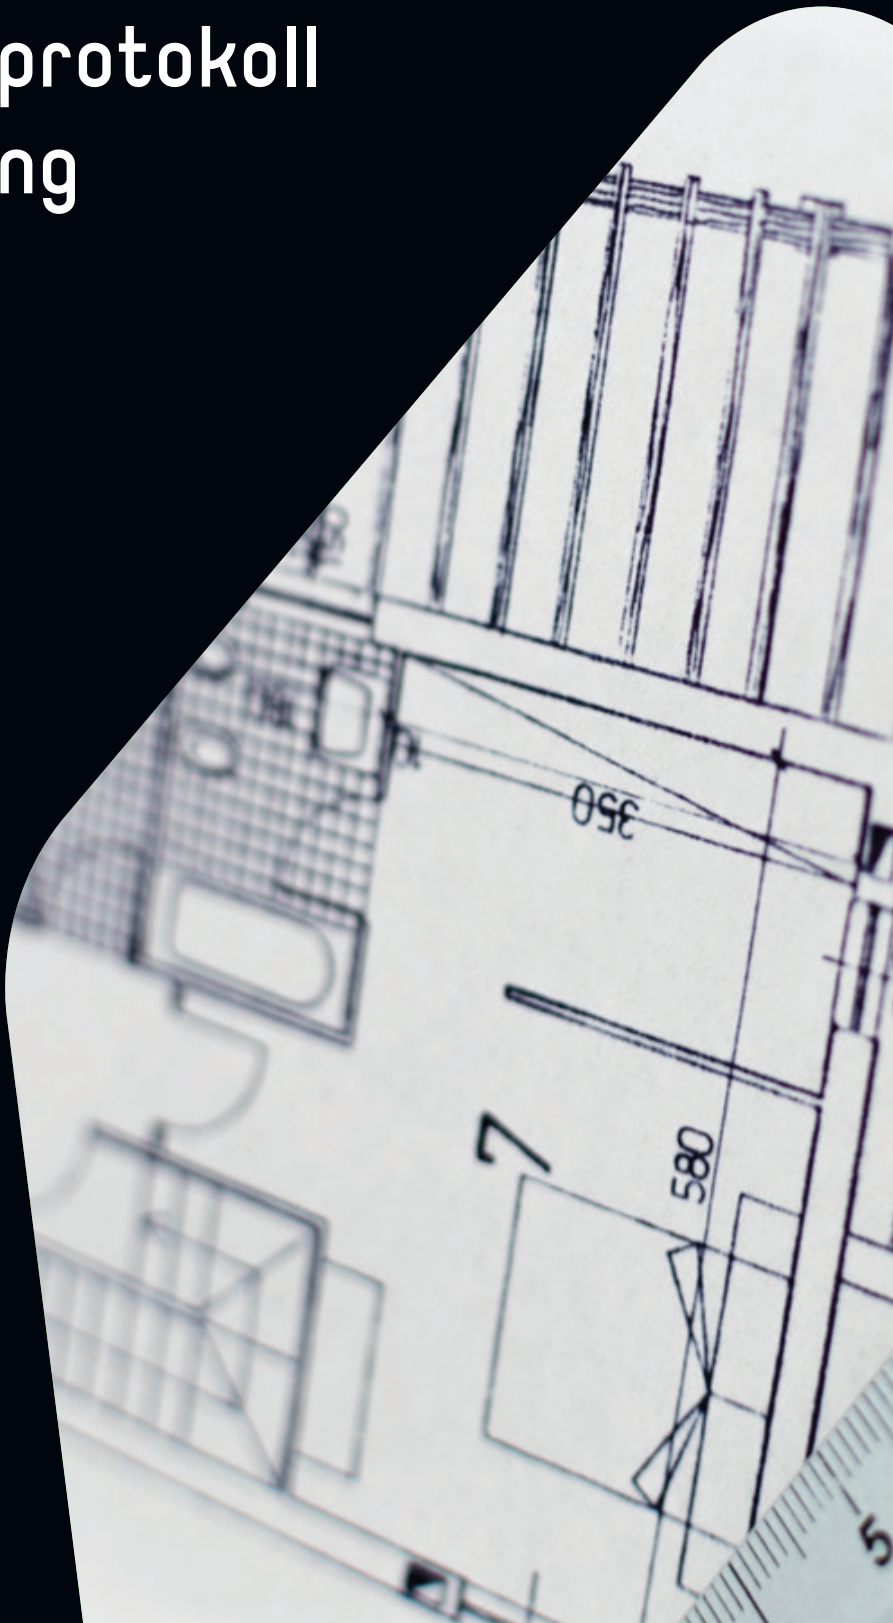

Inbetriebnahmeprotokoll Wohnraumlüftung

Inbetriebnehmer:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Ansprechpartner:

Name / Vorname: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Anlagenstandort:

Projektbezeichnung: _____

Wohnung / Etage: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Betreiber / Mieter:

Name / Vorname: _____

Steuerungsvariante Leaf

- Leaf 1 Air - manuell per Sensorschalter und mit einer Funkverbindung

Anzahl Lüfter: _____

Anzahl Sensorschalter: _____




- Leaf 1 Air - mit Funkanbindung an den Loxone Miniserver Go

Anzahl Lüfter: _____



- Leaf 1 Tree/Air - mit Kabel-/Funkanbindung an den Loxone Miniserver und Miniserver Compact

Anzahl Lüfter: _____



Anlagenprotokoll:

Kontrolliert/Durchgeführt	Erledigt	Anmerkung
Geräte inkl. Filter ¹ fertig installiert (Filter finden Sie in unserem Filtershop) 		
Lüfter und Filter auf Sauberkeit überprüft		
Die Anzahl der Lüfter entspricht den Herstellervorgaben bzw. dem Lüftungskonzept		
Geräte und Regler frei zugänglich		
Überströmung bzw. Luftverbund ist gegeben		
Gemeinsamer Betrieb von KWL und raumluft-abhängiger Feuerstätte ²		
Regelungen und Lüfter verbunden und eingestellt		
Funktionskontrolle aller Geräte durchgeführt		
Funktion und Bedienung der Anlage sowie die Wartungsintervalle erklärt		
Optionales Zubehör (z. B. Kellerset) vorhanden		

¹Ein gemeinsamer Betrieb von Wohnraumlüftungsgeräten und einer raumluftabhängigen Feuerstätte muss vom zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister abgenommen werden. Ggf. sind Sicherheitseinrichtungen erforderlich.

Einstellprotokoll:

Raum	Geräteadresse	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4 (Leaf 1 Stand-alone)
		%	%	%	%
		m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
		%	%	%	%
		m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
		%	%	%	%
		m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
		%	%	%	%
		m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
		%	%	%	%
		m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
		%	%	%	%
		m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
		%	%	%	%
		m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h
		%	%	%	%
		m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h

Bemerkungen:

Die Anlage wurde mängelfrei und ohne Vorbehalte übergeben. Auf etwaige mangelhafte Leistungen anderer am Bauvorhaben beteiligter Gewerke wurde soweit ersichtlich mit einem entsprechenden Vermerk in diesem Protokoll hingewiesen. Dem Eigentümer / Betreiber hat davon Kenntnis genommen, dass jegliche Veränderungen (ausgenommen sind die zur Wartung der Anlage beschriebenen Arbeiten) am Lüftungssystem zu Schäden, Gefahren und dem Erlöschen der Gewährleistung führen können.

Ort / Datum: _____

Unterschrift: _____
(Inbetriebnehmer)

(Betreiber)



**LEAF VENTILATION IST EINE MARKE DER MARLEY DEUTSCHLAND GMBH UND
ENGAGIERT SICH FÜR DIE ENTWICKLUNG, DIE PRODUKTION UND DEN VERTRIEB
VON DEZENTRALEN SYSTEMEN FÜR EINE KONTINUIERLICHE WOHNRAUMLÜFTUNG.**

Leaf Ventilation | eine Marke der | Marley Deutschland GmbH | Adolf-Oesterheld-Str. 28 | 31515 Wunstorf
Telefon: (0 50 31) 53-600 | Telefax: (0 50 31) 53-371 | www.leaf-ventilation.de | info@leaf-ventilation.de
